




Diagnóstico


DREICON

Junio 2026


Reglas de la reunión



Evitar el ping-pong



Tomar nota



Preguntas al final

Introducción

DREICON dice:

"Muchas veces llegan los papeles y yo le consulto si esto está autorizado porque nos ha pasado varias veces de que no han dicho nada, han hecho el gasto y después te encontrás con gastos que no sabemos a qué corresponden."

"Los remitos se pierden en el camino o se tiran directamente en obra"

"Hacía falta ordenar un poco lo que eran los procesos internos, la comunicación, la distinción de roles."

*"A veces alguien le pide algo a un directivo, el directivo me lo pide a mí, y después ese alguien me lo escribe igual.
Es así, un poco por arriba y por abajo."*

"Tengo que andar consultando si se pagó, no se pagó, qué pasó en el medio."

"Yo no llevo un control exacto, no me dan los tiempos para eso."

"Usamos mucho WhatsApp. O sea, el WhatsApp es como nuestro canal principal de comunicación."

"Tenemos como un bache de comunicación entre lo que se planifica y lo que realmente pasa."

"No hacemos evaluación de los proyectos " (A posteriori)



Equipo actual + Proyectos en puerta

***¿Está la organización lista para recibirlos
con la estructura que tiene hoy?***

Crecimiento → **oportunidad**

2

Riesgos críticos
identificados

Dos riesgos que se retroalimentan, **comprometiendo el crecimiento sostenido:**

Riesgo patrimonial Gestión

- Dreicon opera **sin visibilidad** sobre su propia situación financiera.
- Toma de decisiones sin datos confiables

Riesgo de Estructura Capacidad operativa

- La organización está construida alrededor de **personas, no de roles.**
- Necesidad de ordenar los procesos de toma de decisiones y **diferenciación estratégica** y operativa.

Contexto de empresa familiar como punto de partida. Desafío: redefinir alcances en roles y funciones sosteniendo aspectos culturales valorados, propios de la **identidad de Dreicon**



Capacidad técnica



Voluntad de cambio.

A. Riesgo patrimonial / administrativo

IMPACTO

1.


Concentración de funciones críticas en una sola persona en el líder de Administración, sin procesos documentados.

La salida de una persona en el equipo desequilibró el área
2.

Facturación disparada por aviso informal, sin proceso definido. El proceso de facturación a clientes no tiene un disparador formal. Depende de que la persona que maneja la relación con ese cliente recuerde avisar, o de que Legal y Técnica complete el circuito de certificaciones. No hay un proceso documentado que garantice que cada hito contractual genere una factura en tiempo
3.

Circuito de compras sin control: desde la solicitud hasta el pago. No existe un proceso estandarizado de compras. Las solicitudes llegan por diferentes canales (WhatsApp, mail, verbalmente), sin formulario ni autorización formal. No hay monto de aprobación definido. La recepción de materiales no genera un remito que vuelva a administración. La factura llega sin respaldo de lo recibido
4.

Pagos reactivos: se paga a quien reclama. El proceso de gestión de pagos no opera sobre la base de una programación por vencimiento sino sobre la presión del proveedor que reclama. Esto genera un ciclo donde los proveedores más insistentes cobran y los más pasivos esperan

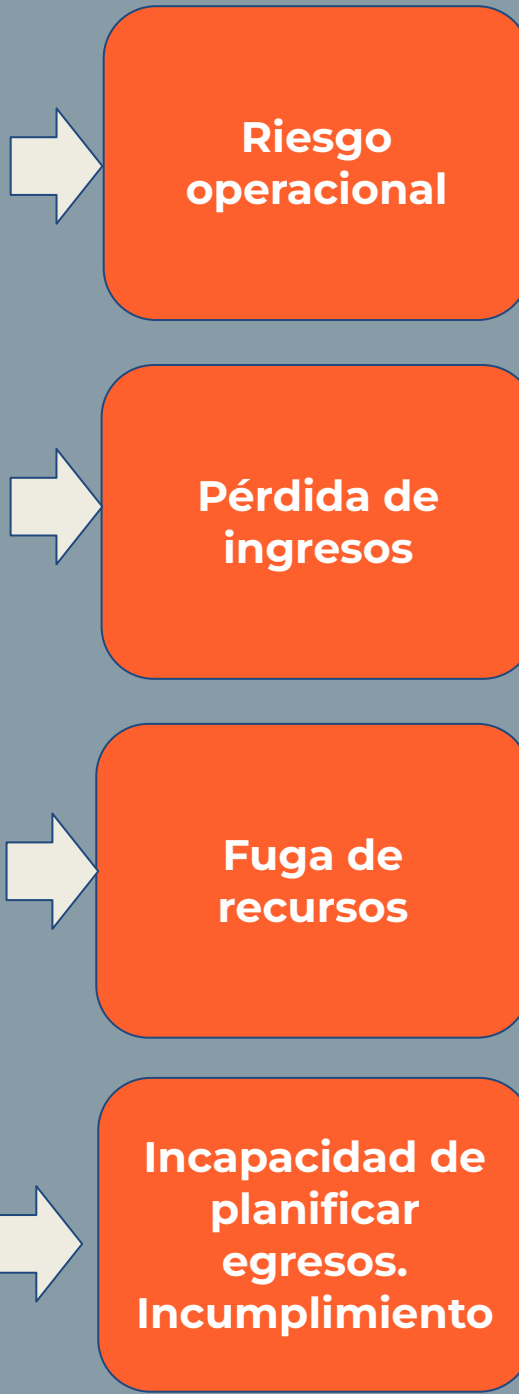

A. Riesgo patrimonial / administrativo

5. Ausencia de cierre de proyectos y control de costos. No se revisan desvíos, no se analiza rentabilidad, no se compara lo presupuestado con lo ejecutado. El conocimiento generado en cada proyecto queda en la memoria de quienes participaron



Rentabilidad desconocida

6. No existe cash flow ni un Estado de Resultados consolidado.
• La Dirección toma decisiones sin visibilidad real de liquidez ni rentabilidad.



Decisiones a ciegas

7. Sistema de gestión con saldos no consistentes, reportes no confiables y ausencia de parametrización de centros de costos. Sin esta información, es imposible conocer la rentabilidad real de cada proyecto. (A revisión de imposibilidades del sistema vs desconocimiento)



Falta de información confiable

8. El inventario y los remitos son puntos ciegos de alto riesgo.



Pérdida de activos

IMPACTO

B. Riesgo de Estructura/Capacidad Operativa

IMPACTO

1. Organigrama. La estructura responde a personalidades, no a lógica funcional. La mayoría no sabe cómo está estructurada la empresa.



Confusión
roles y
funciones

2. Función del Directorio. No se observa una distinción clara de la función del Directorio como “Órgano de Decisión”, diferenciada de las funciones operativas.



Pérdida de
foco
estratégico

3. Micro-gestión directiva y confusión en la línea de mandos. El personal expresa desorientación sobre las jerarquías de delegación (“*Quién me puede delegar cosas a mí o yo a él*”, “*Creo que debería seguir una línea de mando que tenga sentido*”) y una participación activa de mandos altos en tareas operativas que no siempre son canalizadas hacia los responsables correspondientes, lo que lleva también a un bajo nivel de toma de decisiones por parte de los mandos medios .



Cadena de
mando
rota

4. Gerencia General. Posición no formalizada como tal (neutral), que permita ejecutar e implementar las decisiones del Directorio.



Falta de
Dirección
estratégica
unificada

Puntos de apalancamiento



Los equipos identifican problemáticas transversales



PMO con funciones de articulación de las distintas áreas, con conocimiento transversal de la operación.



Se identificaron iniciativas de estandarización de procesos.




Se han comenzado a generar instancias formales de alineamiento y seguimiento entre los niveles de dirección.



El equipo de Dreicon no está resistiéndose al cambio; por el contrario, está buscando organización y claridad en las metas.

¿Cómo salvamos la brecha?

En PCH **identificamos, redefinimos, reorganizamos y resolvemos** los cambios estructurales:

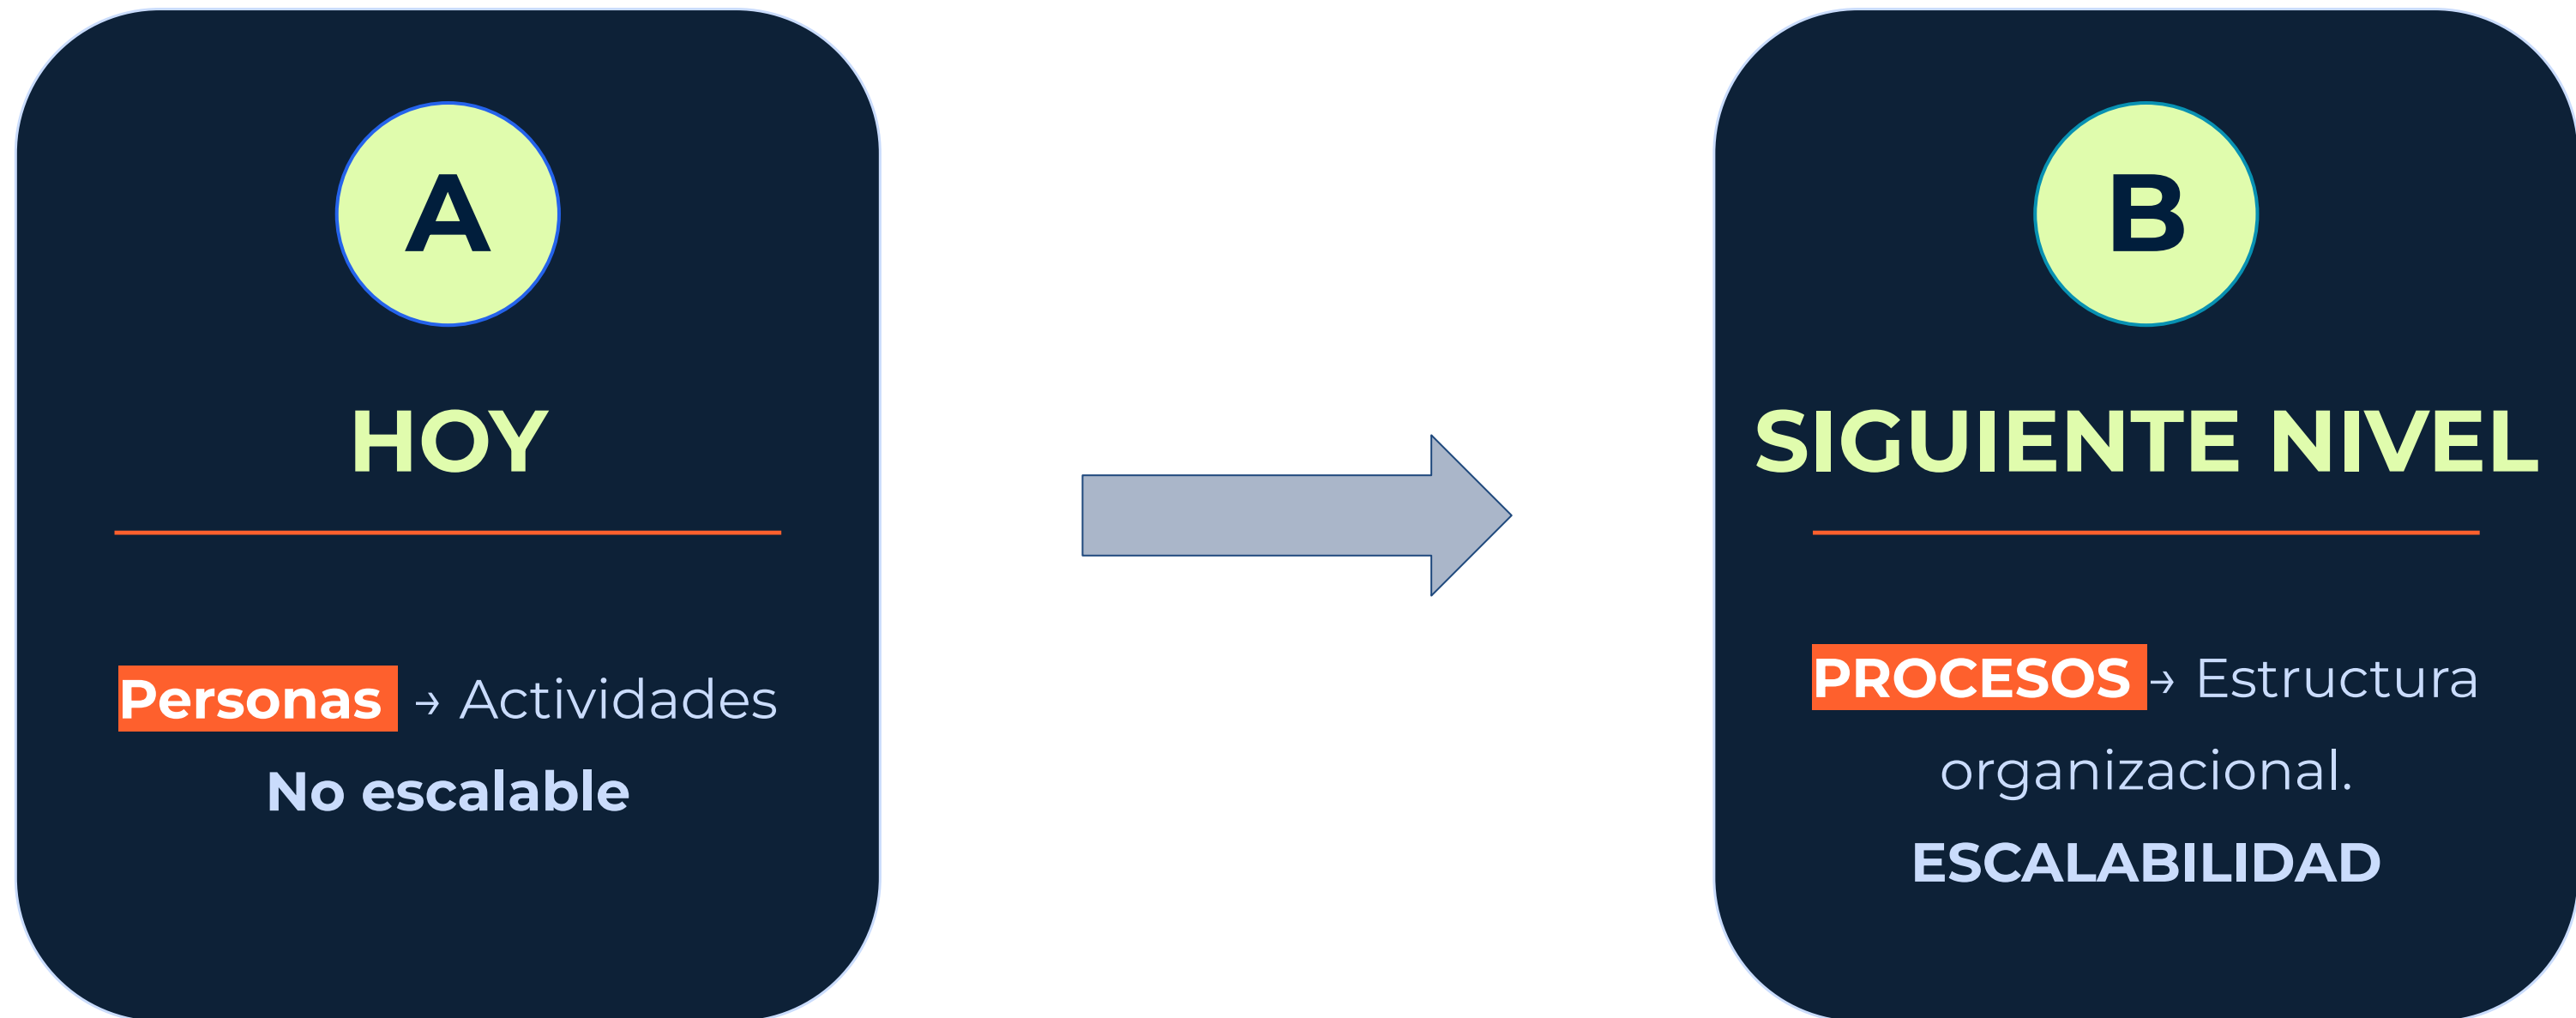

Mapa de procesos DREICON

Procesos Estratégicos

**Planificación
Estratégica**

**Desarrollo
de Negocio**

**Definición
y Comunicación de
políticas**

**Control
de gestión**

Procesos Clave

Comerciales

- **Gestión de clientes**
(segmentación, cartera)
- **Gestión comercial (ventas)**
- **Administración de ventas**
- **Pricing**
- **Gestión de postventa**

Operaciones

- **Planificación del servicio**
- **Ejecución del servicio**
- **Coordinación y gestión de proveedores**

Abastecimiento y Logística

- **Planificación de abastecimiento**
- **Gestión de compras**
- **Gestión de proveedores**
- **Gestión de inventarios**
- **Gestión logística**
(almacenamiento + despacho)

Procesos de Soporte

Administración y Finanzas

- **Facturación**
- **Cobranzas**
- **Pagos**
- **Contabilidad**
- **Gestión financiera (reportes / cashflow)**

Adm. Legal

- **Seguimiento de obligaciones contractuales**
- **Garantías**
- **Reporting**

Sistemas

- **Soporte Sistema**
- **Implementación de tecnología**
- **Mantenimiento de infraestructura**

RRHH

- **Selección y gestión de dotación**
- **Capacitación**
- **Administración de personal**
- **Desarrollo y desempeño**
- **Comunicación interna**

Mapa de procesos DREICON

Procesos Estratégicos

Planificación
Estratégica

Desarrollo
de Negocio

 Definición
y Comunicación de
políticas

 Control
de gestión

Procesos Clave

Comerciales

- Gestión de clientes (segmentación, cartera) 
- Gestión comercial (ventas)
- Administración de ventas
- Pricing
- Gestión de postventa

Operaciones

- Planificación del servicio 
- Ejecución del servicio
- Coordinación de proveedores

Abastecimiento y Logística

- Planificación de abastecimiento 
- Gestión de compras
- Gestión de proveedores
- Gestión de inventarios
- Gestión logística (almacenamiento + despacho)

Procesos de Soporte

Administración y Finanzas

- Facturación 
- Cobranzas
- Pagos
- Contabilidad
- Gestión financiera (reportes / cashflow)

Adm. Legal

- Seguimiento de obligaciones contractuales
- Garantías
- Reporting

Sistemas

- Soporte Sistema 
- Implementación de tecnología
- Mantenimiento de infraestructura

RRHH

- Selección y gestión de dotación 
- Capacitación
- Administración de personal
- Desarrollo y desempeño
- Comunicación interna

Metodología: ejemplo flujo de compras



Organigrama

Directorio

**Gerente
General**

Líder Comercial

**Líder de
Proyectos y
operaciones**

**Líder de
Administración y
Finanzas**

**Líder de
Control de Gestión**

**Líder de
Desarrollo
Organizacional**

oliuan PCH

Organigrama

Directorio

**Gerente
General**

Líder Comercial

**Líder de
Proyectos y
operaciones**

**Líder de
Administración y
Finanzas**

**Líder de
Control de Gestión**

**Líder de
Desarrollo
Organizacional**

Legales

**Asesor
Comercial**

**Cumplimiento
normativo y
asuntos externos**

Organigrama

Directorio

Gerente General

Líder Comercial

**Líder de
Proyectos y
operaciones**

**Líder de
Administración y
Finanzas**

**Líder de
Control de Gestión**

**Líder de
Desarrollo
Organizacional**

PMO

Especialista
químico

Especialista en
regulaciones y
aranceles

Analista de
proyectos

Ingeniería

Seguridad e
Higiene


Jefes de
proyecto/obra

Inspector de
campo

Ingeniero
eléctrico

**Compras y
Logística**

Organigrama

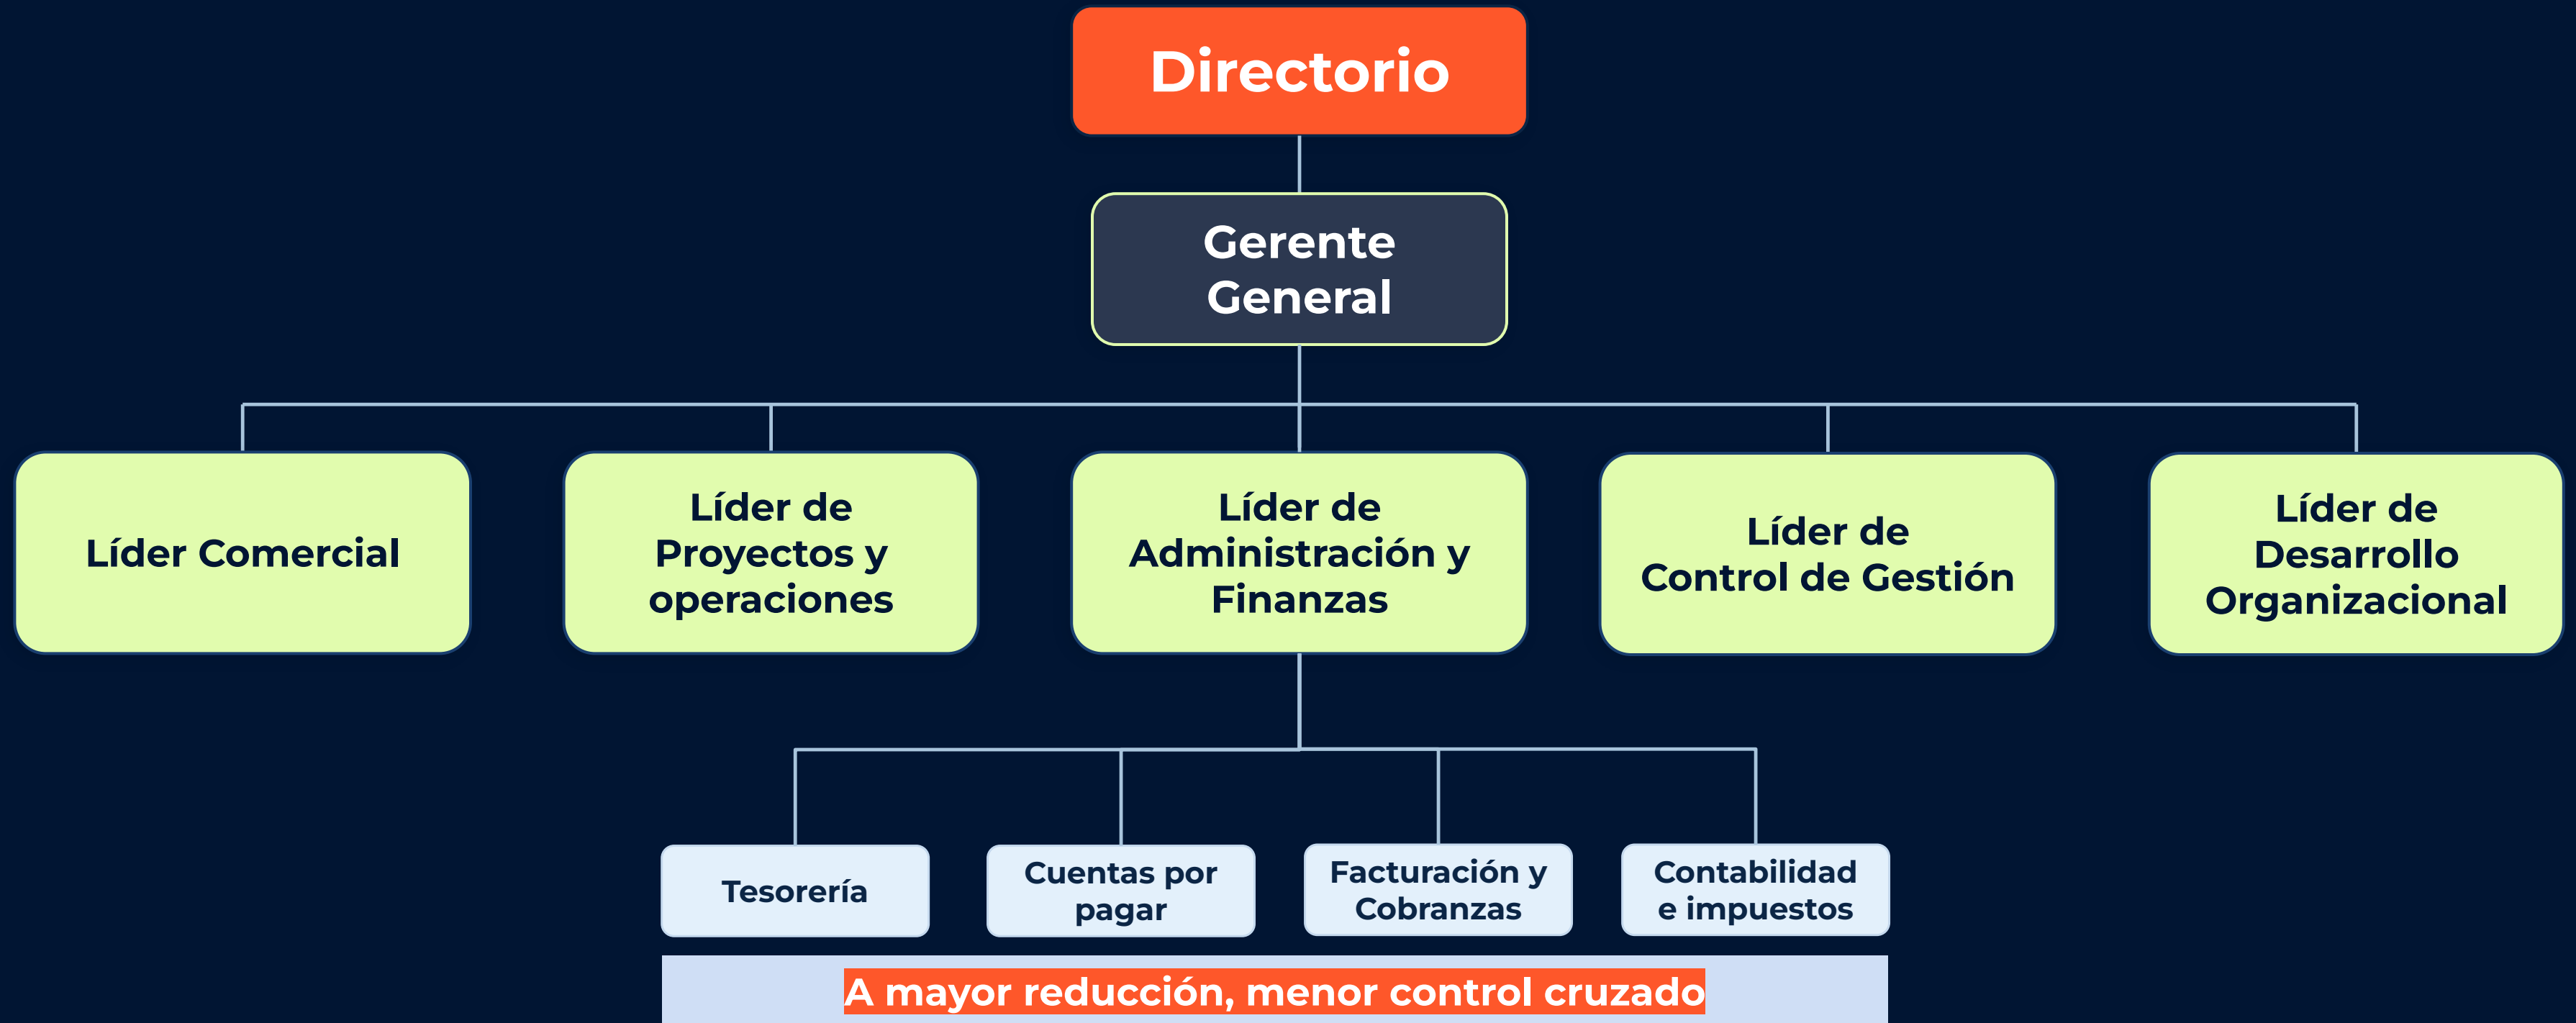

Organigrama

Directorio

**Gerente
General**

Líder Comercial

**Líder de
Proyectos y
operaciones**

**Líder de
Administración y
Finanzas**

**Líder de
Control de Gestión**

**Líder de
Desarrollo
Organizacional**

Analista RRHH

**Adquisición de
Talentos**

**Situaciones
detectadas que
limitan el
crecimiento**

- **Comunicación y relación
entre áreas**

- **Sistema / Información**

- **Procesos**

Riesgo
Patrimonial/
Administrativo


Riesgo de
Estructura/
Capacidad
Operativa

Situaciones encontradas - *Riesgo de Estructura/Capacidad Operativa*

Impacto

1. Comunicación vertical centralizada, sin instancias de seguimiento

- El personal técnico señala que la información clave sobre las necesidades del cliente o los cambios en el negocio queda retenida en la alta dirección y llega tarde a las líneas de ejecución: *"las comunicaciones con el cliente o las decisiones pesadas las manejan los socios y a nosotros nos llega el rebote tarde... nos enteramos de modificaciones del proyecto cuando ya estamos avanzados en la ingeniería"*. Esto refleja además una necesidad de comprender el contexto detrás de las decisiones: *"falta que fluya más la información desde arriba hacia las bases para entender el porqué de los cambios"*.
- A esto se suma la ausencia de espacios periódicos de seguimiento por área: si bien recientemente se comenzaron a implementar reuniones de Directorio, no existen instancias equivalentes a nivel operativo, ni minutas o mecanismos de registro de lo resuelto.



Cuello de
botella
informativo


Impacto: se configura un cuello de botella informativo que desalinea a los equipos técnicos y genera reprocesos por modificaciones comunicadas a destiempo. La falta de seguimiento formal, a su vez, hace que los mismos temas se discutan repetidamente, generando desgaste y pérdida de tiempo.

Situaciones encontradas - Riesgo de Estructura/Capacidad Operativa

Impacto

2. Falta de canales formales para la coordinación entre áreas y aislamiento funcional (silos)

- No existe un protocolo formal para pedir colaboración, insumos o revisiones a otros sectores. Esto obliga a recurrir a la insistencia personal: *"para pedirle algo a otra área dependemos de mandarle un mensajito, cruzar los dedos o ir a perseguirlos al escritorio"*, y deja la priorización a criterios poco objetivos: *"como no hay un circuito formal de pedido entre áreas, todo se define por quién grita más fuerte o qué proyecto tiene más urgencia aparente"*. Los intentos de formalizar este intercambio no lograron sostenerse: *"armé un grupo de WhatsApp de autorizaciones. Al principio lo usaban. Después me dejaron de contestar. Entonces dejé de mandar"*.
- Esta falta de canales convive con una baja visibilidad sobre los procesos transversales: aunque hay claridad sobre las actividades de cada área, no la hay sobre cómo se articulan entre sí: *"hay mucha gente dentro de la empresa que yo no distingo muy bien cuáles son sus funciones, y probablemente a ellos les pasa lo mismo conmigo"*.



Pérdida de eficiencia y de sinergia entre áreas

Impacto: las relaciones entre áreas quedan reguladas por la presión discrecional y la afinidad personal, generando duplicaciones, omisiones y contradicciones, ya que nadie tiene certeza de qué se acordó ni con quién. A esto se suma una ceguera organizacional respecto al funcionamiento real de la empresa, que dificulta las sinergias operativas y el escalamiento coordinado de los proyectos.

Situaciones encontradas

1. Dispersión, obsolescencia y falta de unificación de la gestión documental

- Los colaboradores señalan que la empresa convive con una multiplicidad de carpetas, nubes y herramientas que no se comunican entre sí, lo que dificulta encontrar documentación válida: *"la información hoy en Dreicon está un poco dispersa. Tenemos cosas en el servidor viejo, cosas en el SharePoint nuevo, cosas que la gente guarda en sus computadoras locales"*. A esto se suma la falta de control de versiones: *"muchas veces no sabemos cuál es la última versión de un plano o de un entregable porque no hay un sistema de control de versiones riguroso"*.

Impacto: ante la inexistencia de un Sistema de Gestión Documental (DMS) unificado y gobernado, la dispersión de archivos en múltiples soportes incrementa el riesgo de trabajar con ingeniería obsoleta y ralentiza los tiempos de búsqueda del personal.

Impacto

Falta de trazabilidad

2. Sistema de gestión administrativo-contable desactualizado, mal parametrizado y sin decisión de reemplazo

- En 2023-2024 se llevó adelante un proceso de evaluación de nuevos sistemas (incluyendo Finnegans), que avanzó hasta reuniones con proveedores pero nunca llegó a una decisión, quedando en suspenso indefinido, sin fecha ni responsable para retomarlo: *"buscamos un sistema contable. Estuvimos reunidos tres meses. Vino gente a la oficina. Hicimos un gran proceso. Y después seguimos con el actual. No es que dijimos que no: fue quedando"*.


Falta soporte tecnológico ágil y consistente

Situaciones encontradas

- Esta indecisión convive con una **incorrecta parametrización y subutilización del sistema actual**, que impide establecer controles, validaciones y restricciones operativas en procesos críticos. Entre los ejemplos relevados se observa que el sistema no tiene centros de costo parametrizados ni órdenes de compra que permitan dar seguimiento a las necesidades de abastecimiento. A nivel contable, no se distingue correctamente entre monedas: *"a nivel contable veo que la información para el balance no es buena. Te tira en pesos y en dólares como si fuese todo pesos. Tenés que estar mirando que lo que dice 4000 no son 4000 pesos sino 4000 dólares"*. Asimismo, la carga inicial de información es deficiente y obliga a reprocesos posteriores: *"la información que pedís hay que hacer mucho proceso porque nace mal: una factura no se carga con todos los datos inicialmente"*.

Impacto: la combinación de un sistema obsoleto, sin definición de reemplazo, y mal aprovechado en sus funcionalidades existentes dificulta la toma de decisiones basadas en datos confiables, genera pérdida de trazabilidad por falta de integración entre módulos, y limita las automatizaciones y controles cruzados necesarios para una gestión administrativo-contable robusta.

Impacto



Información
no trazable

Procesos


Situación encontrada

1. Falta de estandarización en procesos operativos y administrativos


- En el seguimiento de obras y proyectos, el personal técnico reporta que no existen procesos homogéneos para contrastar lo planificado contra lo real: *"falta estandarizar el proceso en el cual nosotros hacemos el seguimiento de los hitos y de las tareas de los proyectos"*. Esto provoca desfases severos en la detección de alertas: *"hoy lo que nos pasa es que tenemos como Gaps de tiempo (...) en el cual no nos enteramos a tiempo de los desvíos. Entonces cuando nos enteramos el desvío ya se produjo y ya impactó"*. Los pocos procesos que llegaron a documentarse fueron abandonados por falta de adhesión.
- Esta misma informalidad se observa en los flujos administrativos que habilitan la operación, como compras, autorizaciones de gastos o carga de horas, que se ejecutan de manera artesanal: *"todo lo que es la parte de compras o aprobaciones se hace medio de palabra o mandando un mail suelto"* y *"no tenemos un sistema donde yo cargue las horas que le dedico a cada proyecto de forma automatizada, lo hacemos en un Excel que después se pierde o no se llena a tiempo"*.

Impacto: la ausencia de un proceso estandarizado de control de gestión y planning, sin un flujo de reporte unificado entre obra y oficina, hace que la empresa reaccione tarde ante los retrasos, afectando los plazos comprometidos con el cliente. A su vez, la dependencia de autorizaciones verbales y planillas manuales debilita el control interno, impide calcular con exactitud la rentabilidad real por proyecto (horas-hombre invertidas) y ralentiza el abastecimiento.

Impacto



Desvíos
detectados
tarde



Baja eficiencia
No escalable


Procesos

Situación encontrada

2. Desconexión entre el Área Comercial y las Áreas de Ejecución (Ingeniería / PMO)

- Se detectan tensiones y falta de traspaso de información cuando un proyecto pasa de la fase de propuesta a la de ejecución: *"comercial cierra un contrato o promete plazos al cliente sin validar al 100% con la capacidad real que tenemos en el equipo de ingeniería"*. Una vez que el proyecto ingresa a la empresa, no existe una instancia formal de traspaso: *"cuando el proyecto entra a la empresa, no hay una reunión de traspaso formal donde Comercial nos cuente los supuestos que usó para cotizar, arrancamos adivinando"*.

Impacto: se generan promesas al cliente sin respaldo en la capacidad real de ejecución, obligando a los equipos de ingeniería a partir de supuestos no validados.




Incumplimientos
hacia el Cliente

3. Ausencia de objetivos, KPIs, feedback y definición formal de roles

- Se evidencia la carencia de metas e instancias de evaluación institucionalizadas: *"claramente no, no existen esos objetivos o metas para cada rol"*. Los objetivos, cuando existen, son definidos por las mismas personas que deben cumplirlos, sin un seguimiento formal, lo que lleva a los empleados a reclamar una guía desde niveles superiores: *"un feedback sería bastante bueno (...) creo que podría venir desde más arriba todavía"*.
- Esta falta de definición se replica en los puestos de trabajo, donde la informalidad diluye los límites de las tareas de cada rol: *"trabajamos todos medio de manera informal", "hacía falta ordenar un poco lo que eran los procesos internos, la comunicación, la distinción de roles"*.

Impacto: la combinación de objetivos no formalizados, ausencia de feedback estructurado e indefinición de roles genera una ceguera organizacional sobre quién es responsable de qué, dificultando la evaluación del desempeño y el ordenamiento interno.



Ceguera
organizacional


Impacto

Ejes de trabajo. Propuestas:


”qué, cuándo y cómo”.

¿Cómo seguimos?


Plan de Acción KHEA

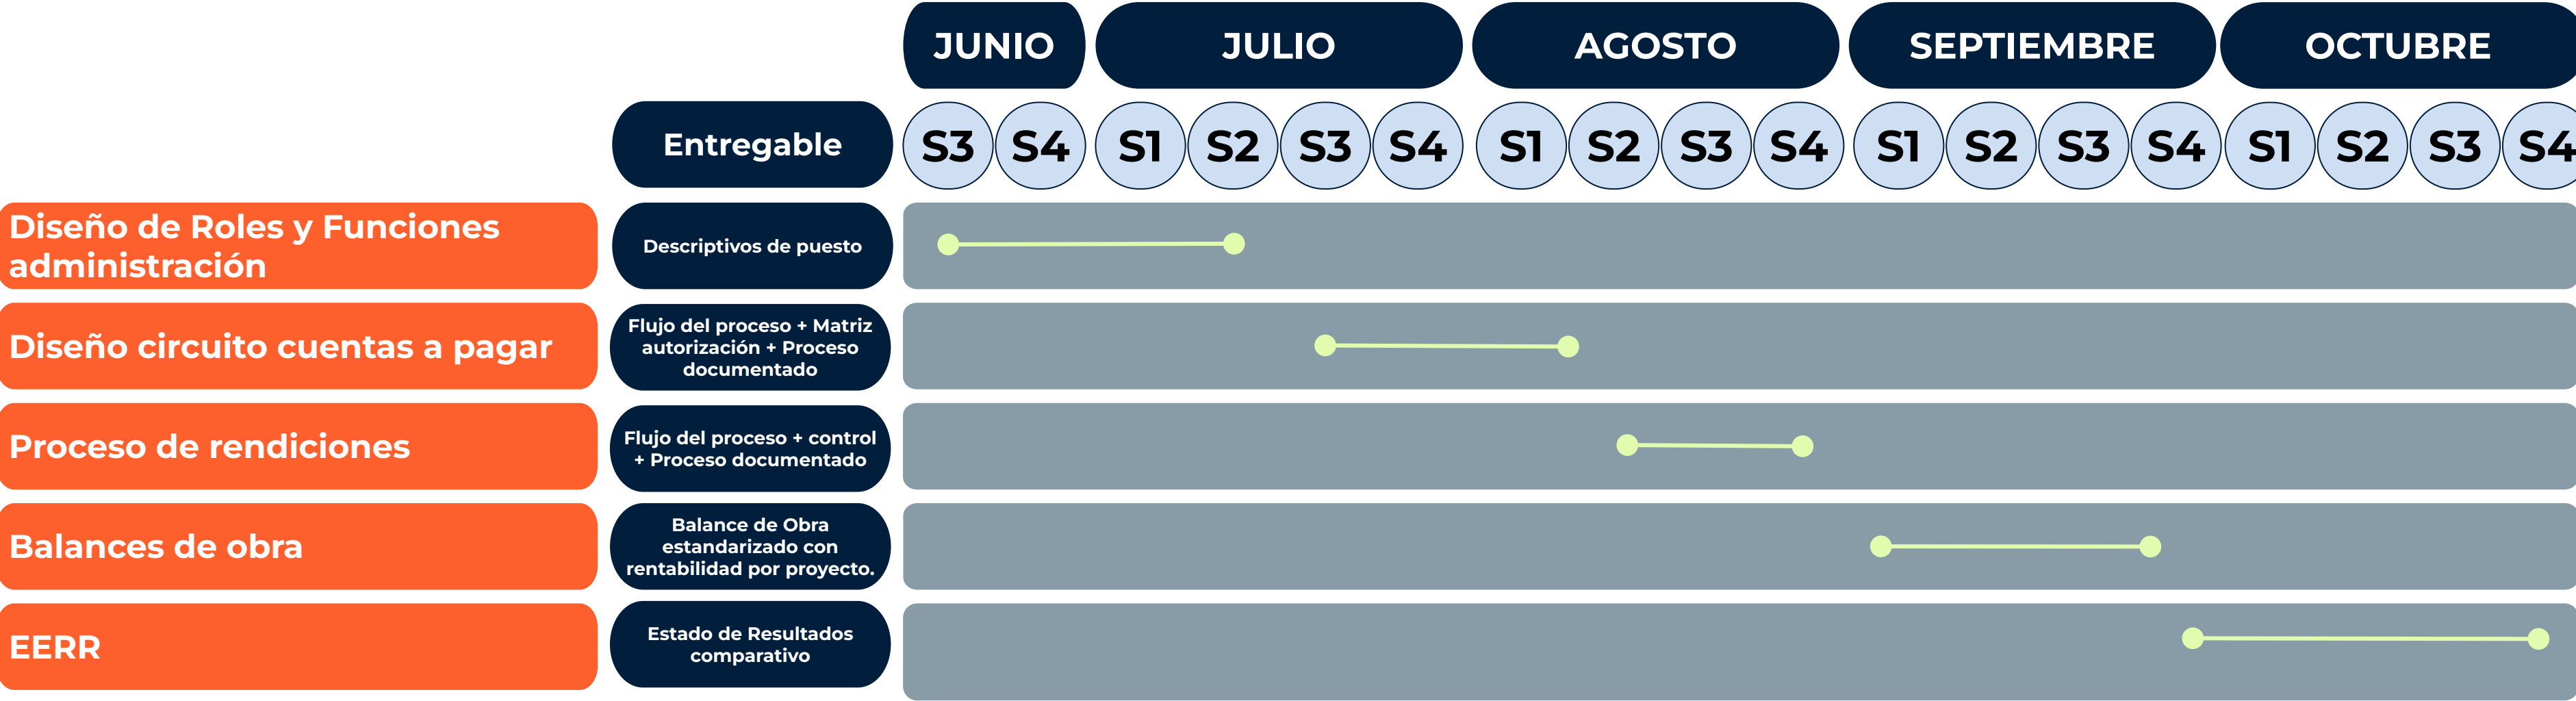

Objetivo: no perder - evitar fuga

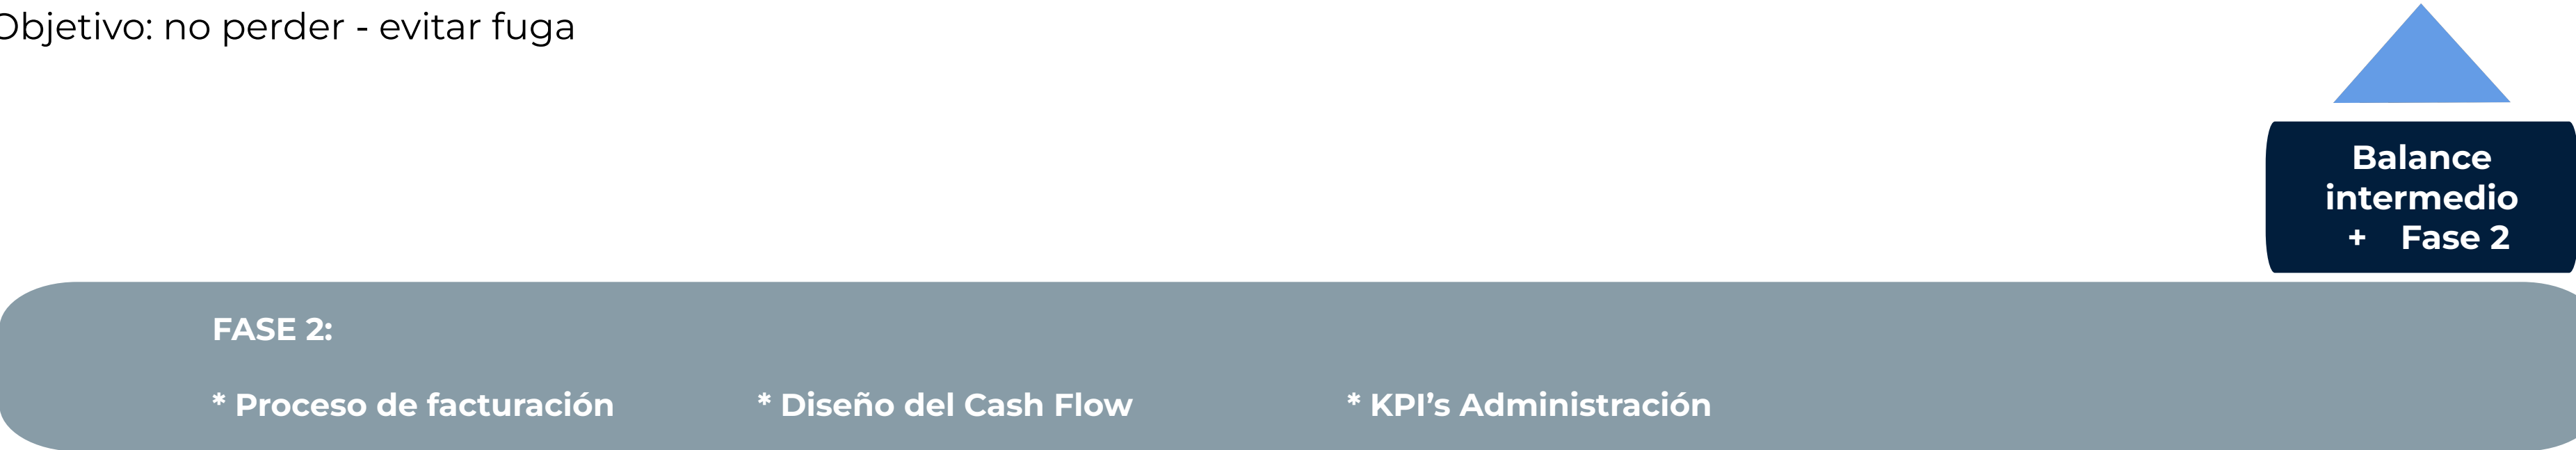

Plan de Acción procesos y organigrama

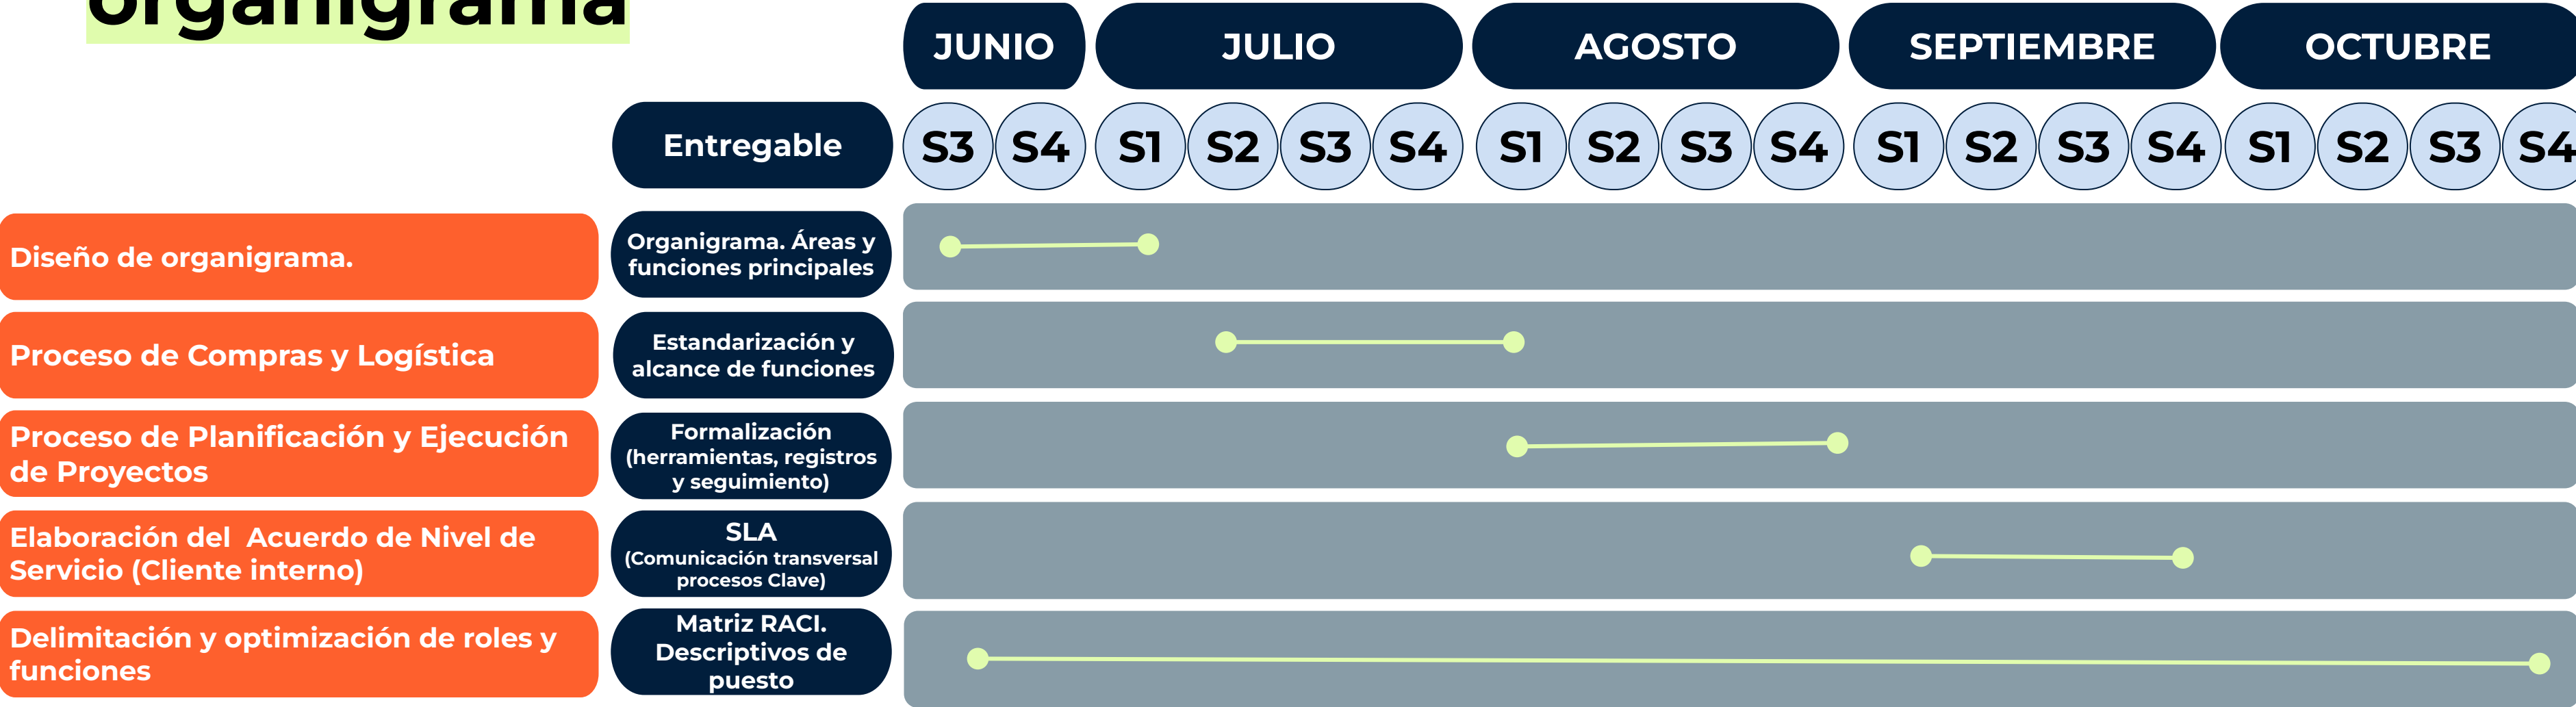

Balance
intermedio
+ Fase 2

Próximos pasos



Validar el plan de acción

Asignar líderes de proyecto

Calendarizar reuniones de avance

¿Preguntas?

iGracias!

11 5125 9300 | paula@pchconsultora.com | www.pchconsultora.com
